

Proposta Comercial

Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Serviços de Manutenção de Piscinas

1. PARTES

1.1 Contratante

Ellias Mêndes:

CNPJ/CPF: [informar]

Endereço: [informar]

Telefone: +55 85 9297-1562

E-mail: eliasmthiasm@hotmail.com

1.2 Contratada

Daivisson Sobral – Pessoa Física

CPF: **341.400.668-57**

Endereço: **Rua Antônio Marques Caldeira, 3676, Regissol, Mirassol – SP, 15.133-354**

Telefone: **17 99174-0497**

E-mail: dsobral@outlook.com

2. OBJETIVO DA PROPOSTA

Desenvolvimento e entrega de um sistema web e mobile responsivo para gestão de serviços de manutenção de piscinas, incluindo cadastro de clientes, piscinas, produtos, ordens de serviço, relatórios automatizados, suporte técnico inicial e operação assistida para a equipe da CONTRATANTE.

O projeto contempla desenvolvimento personalizado, operação assistida e suporte corretivo, permitindo evolução futura de acordo com as necessidades do negócio.

3. ESCOPO DO PROJETO

3.1 Primeira Fase (MVP – Produto Mínimo Viável)

- Configuração do ambiente e arquitetura base
- Cadastros básicos: Clientes, Piscinas, Produtos e Usuários
- Gestão de Ordens de Serviço (OS) com checklist obrigatório
- Upload de fotos e vídeos no fluxo da OS

- Emissão de relatório diário básico em PDF enviado automaticamente ao cliente
- Autenticação e controle de perfis de acesso
- Interface responsiva para desktop, tablet e celular

3.2 Segunda Fase (Funcionalidades Evolutivas)

- Relatórios mensais avançados com assinatura digital
- Controle de estoque do cliente e alertas de reabastecimento
- Integração com GPS para rotas e cálculo de deslocamento
- Bonificação de funcionários baseada em performance

3.3 Terceira Fase (Recursos Avançados)

- Reagendamento de visitas e gestão de ocorrências
- Gestão de equipamentos automatizados com alertas preventivos
- Operação offline (PWA) com sincronização automática
- Melhorias de usabilidade (UI/UX) e performance

3.4 Operação Assistida e Suporte Inicial

- Após a entrega do MVP, será realizada operação assistida, incluindo:
- Acompanhamento direto do uso inicial do sistema 4 semanas
- Treinamento básico para os usuários da CONTRATANTE
- Apoio na configuração de relatórios, cadastros e ajustes iniciais
- Suporte técnico remoto para esclarecimento de dúvidas
- Correções pontuais de erros identificados durante a operação assistida

4. TECNOLOGIAS E METODOLOGIA

4.1 Tecnologias


- Frontend: Blazor WebAssembly + Tailwind CSS 4.0
- Backend: ASP.NET Core 8 + EF Core
- Banco de Dados: SQL Server
- Hospedagem: Ambiente a ser definido pela Contratante (Azure, AWS ou outro provedor)
- Apoio de IA: Cursor, VSCode, ChatGPT e Copilot. Utilização de Inteligência Artificial para acelerar geração de código, testes e refatoração. Os **prompts** serão armazenados para serem utilizados como referência em novos desenvolvimentos.

4.2 Metodologia

- **Gerenciamento do projeto:** Será utilizada metodologia híbrida, combinando ágil com o tradicional modelo cascata. A ferramenta Clickup será utilizada para acompanhamento do progresso do projeto combinada com o Github
- **Desenvolvimento:** Para o desenvolvimento, será utilizada metodologia Ágil com framework Scrum
- **Repositório:** Todo o código fonte do projeto será armazenado no Github na conta DaivissonSobral, que é particular e privada. Ao término do projeto, o repositório será compartilhado com uma conta do contratante.

5. CRONOGRAMA E CARGA HORÁRIA

5.1 Cronograma

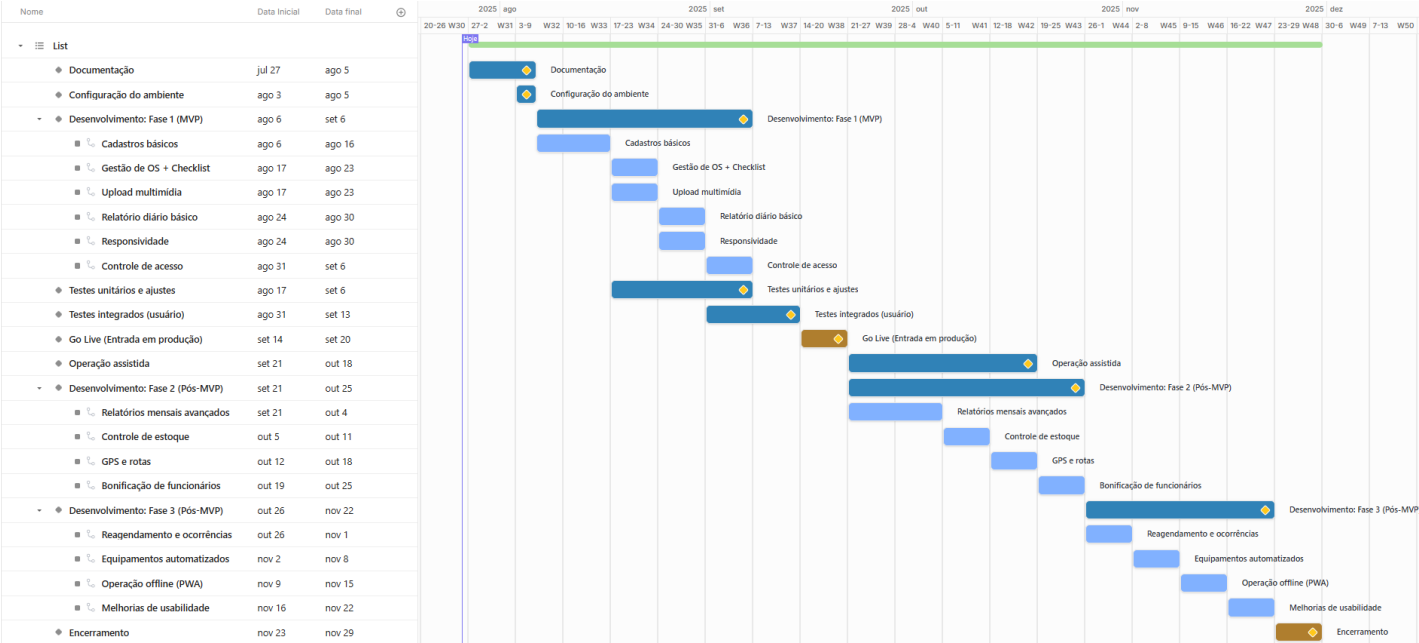

5.2 Cronograma Lista

Nome	Data inicial	Data de vencimento	Estimativa de tempo	Recurso
Documentação	Amanhã	ago 5	8h	Arquiteto
Configuração do ambiente	ago 3	ago 5	20h	Arquiteto
Desenvolvimento: Fase 1 (MVP)	ago 6	set 6	116h	DEV
Cadastros básicos: Clientes, Piscinas, Produtos e Usuários	ago 6	ago 16	30h	DEV
Gestão de Ordens de Serviço (OS) com checklist obrigatório	ago 17	ago 23	30h	DEV
Upload de fotos e vídeos no fluxo da OS	ago 17	ago 23	20h	DEV
Emissão de relatório diário básico em PDF enviado automaticamente ao cliente	ago 24	ago 30	20h	DEV
Interface responsiva para desktop, tablet e celular	ago 24	ago 30	16h	DEV
Autenticação e controle de perfis de acesso	ago 31	set 6	8h	DEV
Testes unitários e ajustes	ago 17	set 6	24h	Tester
Testes integrados (usuário)	ago 31	set 13	16h	Consultor
Go Live (Entrada em produção)	set 14	set 20	4h	Consultor
Operação assistida	set 21	out 18	16h	Consultor
Desenvolvimento: Fase 2 (Pós-MVP)	set 21	out 25	84h	DEV
Relatórios mensais avançados com assinatura digital	set 21	out 4	20h	DEV
Controle de estoque do cliente e alertas de reabastecimento	out 5	out 11	20h	DEV
Integração com GPS para rotas e cálculo de deslocamento	out 12	out 18	24h	DEV
Bonificação de funcionários baseada em performance	out 19	out 25	20h	DEV
Desenvolvimento: Fase 3 (Pós-MVP)	out 26	nov 22	88h	DEV
Reagendamento de visitas e gestão de ocorrências	out 26	nov 1	16h	DEV
Gestão de equipamentos automatizados com alertas preventivos	nov 2	nov 8	20h	DEV
Operação offline (PWA) com sincronização automática	nov 9	nov 15	32h	DEV
Melhorias de usabilidade (UI/UX) e performance	nov 16	nov 22	20h	DEV
Encerramento	nov 23	nov 29	4h	Arquiteto

Link do cronograma: <https://sharing.clickup.com/9007028554/g/h/6-901410178494-7/4506833242046b1>

5.1 Disponibilidade semanal para execução:

- Segunda a sexta: 3h/dia (15h/semana)
- Sábado e domingo: 4h/dia (8h/semana)
- Total semanal: 23h/semana

5.2 Tempo estimado:

- Fase 1 (MVP): 6 semanas
- Fase 2: 5 semanas
- Fase 3: 4 semanas

6. DIREITOS E RESPONSABILIDADES

6.1 Da Contratada

- Desenvolver o sistema de acordo com o escopo aprovado
- Fornecer relatórios de progresso a cada etapa
- Garantir qualidade do código, performance e segurança básica
- Realizar treinamento básico e operação assistida após entrega do MVP
- Disponibilizar suporte técnico durante a fase de operação assistida

6.2 Da Contratante

- Disponibilizar informações, regras de negócio e validações necessárias
- Designar um responsável para aprovar as etapas entregues
- Custear hospedagem, domínio e eventuais licenças externas
- Efetuar os pagamentos conforme acordado

7. SUPORTE, GARANTIA E OPERAÇÃO ASSISTIDA

- **Operação Assistida:** acompanhamento direto por **4 semanas após a entrega do MVP**, com suporte remoto e correções pontuais.
- **Suporte Corretivo:** durante a operação assistida, correções de falhas identificadas serão tratadas sem custos adicionais.
- Após o período de operação assistida, poderá ser contratado **suporte evolutivo e manutenção mensal** mediante aditivo comercial.
- O código-fonte será **propriedade da Contratante após o pagamento integral**, com direito de uso e modificação.

8. CONFIDENCIALIDADE E SEGURANÇA

Ambas as partes se comprometem a manter sigilo sobre informações estratégicas, documentos e dados fornecidos durante o desenvolvimento e operação do sistema.

9. INVESTIMENTO E PAGAMENTO

Fase	Item	Horas	Recurso	Valor Unit.	Valor Total
Fase 1	Documentação	8	Arquiteto	R\$ 120,00	R\$ 960,00
Fase 1	Configuração do ambiente e arquitetura	20	Arquiteto	R\$ 120,00	R\$ 2.400,00
Fase 1	Cadastros básicos: Clientes, Piscinas, Produtos e Usuários	30	Desenvolvedor	R\$ 100,00	R\$ 3.000,00
Fase 1	Gestão de Ordens de Serviço (OS) com checklist obrigatório	30	Desenvolvedor	R\$ 100,00	R\$ 3.000,00
Fase 1	Upload de fotos e vídeos no fluxo da OS	20	Desenvolvedor	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00
Fase 1	Emissão de relatório diário básico em PDF enviado automaticamente ao cliente	20	Desenvolvedor	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00
Fase 1	Autenticação e controle de perfis de acesso	8	Desenvolvedor	R\$ 100,00	R\$ 800,00
Fase 1	Interface responsiva para desktop, tablet e celular	16	Desenvolvedor	R\$ 100,00	R\$ 1.600,00
Fase 1	Testes unitários e ajustes	24	Tester	R\$ 75,00	R\$ 1.800,00
Fase 1	Testes integrados (usuário)	16	Consultor	R\$ 75,00	R\$ 1.200,00
Fase 1	Go Live (Entrada em produção)	4	Consultor	R\$ 75,00	R\$ 300,00
Fase 1	Operação assistida	16	Consultor	R\$ 75,00	R\$ 1.200,00
Fase 2	Relatórios mensais avançados com assinatura digital	20	Desenvolvedor	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00
Fase 2	Controle de estoque do cliente e alertas de reabastecimento	20	Desenvolvedor	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00
Fase 2	Integração com GPS para rotas e cálculo de deslocamento	24	Desenvolvedor	R\$ 100,00	R\$ 2.400,00
Fase 2	Bonificação de funcionários baseada em performance	20	Desenvolvedor	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00
Fase 3	Reagendamento de visitas e gestão de ocorrências	16	Desenvolvedor	R\$ 100,00	R\$ 1.600,00
Fase 3	Gestão de equipamentos automatizados com alertas preventivos	20	Desenvolvedor	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00
Fase 3	Operação offline (PWA) com sincronização automática	32	Desenvolvedor	R\$ 100,00	R\$ 3.200,00
Fase 3	Melhorias de usabilidade (UI/UX) e performance	20	Desenvolvedor	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00
Fase 3	Encerramento	4	Arquiteto	R\$ 120,00	R\$ 480,00
Total					R\$ 37.940,00

O investimento poderá ser definido por fase ou pacote completo, com as seguintes condições padrão:

25% na aprovação da proposta	R\$ 9.485,00
25% na entrega da fase 1 (MVP)	R\$ 9.485,00
25% na entrega da fase 2 (Funcionalidades Evolutivas)	R\$ 9.485,00
25% na entrega da fase 3 (Recursos Avançados)	R\$ 9.485,00

Valores finais serão acordados após validação de escopo. Caso haja necessidade de alterações significativas após o início, um aditivo comercial poderá ser formalizado.

A fase de Operação Assistida (30 dias) está inclusa no valor do MVP. Caso seja necessária extensão do período de operação assistida, será definido novo investimento.

As etapas e entregas poderão ser **aprovadas por meio de confirmação simples ("De Acordo") via e-mail ou WhatsApp**, garantindo agilidade no processo sem necessidade de assinatura presencial.

10. VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta é válida por **30 dias** a partir de sua emissão. Após este prazo, os valores e condições poderão ser atualizados conforme disponibilidade e agenda do contratado.

11. CONCLUSÃO

O projeto proporcionará à CONTRATANTE uma solução moderna, escalável e eficiente, permitindo otimizar operações, reduzir custos e melhorar o relacionamento com os clientes.

Com o uso de tecnologias atualizadas, apoio de IA e operação assistida, será possível ter um MVP funcional em apenas 6 semanas, garantindo que a equipe se adapte com segurança antes de evoluir para novas funcionalidades.

11. APROVAÇÕES DA PROPOSTA

Essa proposta poderá ser **aprovada por meio de confirmação simples (“De Acordo”) via e-mail ou WhatsApp**, garantindo agilidade no processo sem necessidade de assinatura presencial.

11. CONCLUSÃO

O projeto proporcionará à CONTRATADA uma solução moderna, escalável e eficiente, permitindo otimizar operações, reduzir custos e melhorar o relacionamento com os clientes.

Com o uso de **tecnologias atualizadas, apoio de IA e operação assistida**, será possível ter um **MVP funcional em apenas ~6 semanas**, garantindo que a equipe se adapte com segurança antes de evoluir para novas funcionalidades.
